


ID	Kód	Název úkolu	Délka, velikost	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0		<b>KANALIZACE A ČOV OBČÍ OLDŘIŠ A BOROVÁ</b>		<b>503 dny</b>	<b>04.03. 19</b>	<b>26.02. 21</b>
1		<i>Předání stavby, zahájení výstavby zařízení staveniště</i>		<i>0 dny</i>	<i>04.03. 19</i>	<i>04.03. 19</i>
2	VON	Vedlejší a ostatní náklady		498 dny	04.03. 19	19.02. 21
3		<i>Ukončení přípravy staveniště</i>		<i>30 dny</i>	<i>11.03. 19</i>	<i>19.04. 19</i>
4	SO1	Čistiřna odpadních vod	1991 EO	200 dny	02.09. 19	16.06. 20
5	SO1_10	Provozně-technické objekty a oplocení ČOV	200 dny	200 dny	02.09. 19	16.06. 20
6		<i>Zahájení prací na ČOV</i>		<i>0 dny</i>	<i>02.09. 19</i>	<i>02.09. 19</i>
7	SO1_10_1	Stavební část ČOV	150 dny	150 dny	02.09. 19	03.04. 20
8	SO1_10_2	Zdravotně-technická instalace ČOV	50 dny	50 dny	06.01. 20	13.03. 20
9	SO1_10_3	Oplocení areálu ČOV	20 dny	20 dny	20.05. 20	16.06. 20
10	SO1_10_4	Stavební elektroinstalace	70 dny	70 dny	17.12. 19	27.03. 20
11		<i>Ukončení stavební části ČOV, připravenost pro montáž technologie</i>		<i>0 dny</i>	<i>03.04. 20</i>	<i>03.04. 20</i>
12	SO1_20	Příjezdová komunikace a zpevněné plochy	40 dny	40 dny	23.03. 20	19.05. 20
13	SO1_30	Trubní vedení	80 dny	80 dny	12.11. 19	06.03. 20
14	SO1_40	Přípojka NN pro ČOV	15 dny	15 dny	14.10. 19	04.11. 19
15	SO1_50	Vodovod pro ČOV	15 dny	15 dny	16.10. 19	06.11. 19
16	SO1_60	Terénní a sadové úpravy	30 dny	30 dny	20.05. 20	30.06. 20
17		<i>Ukončení veškerých prací na ČOV</i>		<i>0 dny</i>	<i>30.06. 20</i>	<i>30.06. 20</i>
18	SO2	Kanalizace Oldřiš	454 dny	454 dny	19.04. 19	08.02. 21
19		<i>Zahájení prací na splaškové kanalizaci Oldřiš</i>		<i>0 dny</i>	<i>19.04. 19</i>	<i>19.04. 19</i>
20	SO2_11(12)	Gravitační splašková kanalizace	10015,6	443 dny	26.04. 19	28.01. 21
21		žlutá etapa (A Š1-Š43, A1-A8-2)	3746,49	375 dny	05.08. 19	28.01. 21
22		oranžová etapa (A Š43-Š74, A9, A10 Š48-Š72, A10.1-A10.5, A11, A12)	3331,15	333 dny	26.04. 19	19.08. 20
23		červená etapa (A Š74-Š115, A10 Š272-Š301, A10.6-A10.8, A13-A18)	2937,61	294 dny	30.09. 19	27.11. 20
24	SO2_21(22)	Veřejná část kanalizačních přípojek	1706,0	430 dny	28.05. 19	08.02. 21
25		<i>Ukončení prací řadech a přípojkách Oldřiš</i>		<i>0 dny</i>	<i>08.02. 21</i>	<i>08.02. 21</i>
26		Komunikace	30 dny	30 dny	21.09. 20	03.11. 20
27	SO3	Kanalizace Borová	468 dny	468 dny	19.04. 19	26.02. 21
28		<i>Zahájení prací na splaškové kanalizaci Borová</i>		<i>0 dny</i>	<i>19.04. 19</i>	<i>19.04. 19</i>
29	SO3_11(12)	Splašková kanalizace	12506,0	413 dny	26.04. 19	14.12. 20
30		červená etapa (B0)	300,5	31 dny	30.10. 20	14.12. 20
31		fialová etapa (B Š1-Š36, B1-88)	3224,55	323 dny	26.04. 19	05.08. 20
32		modrá etapa (B Š36-Š71, B9-B16)	3013,45	302 dny	26.04. 19	07.07. 20
33		zelená etapa (B Š71-Š111, B17-B21)	2826,5	283 dny	30.09. 19	11.11. 20
34		hnědá etapa (B Š111-Š148, B22-B27)	3141	315 dny	16.09. 19	14.12. 20
35	SO3_21(22)	Veřejná část kanalizačních přípojek	1861,0	372 dny	06.09. 19	26.02. 21
36		<i>Ukončení prací řadech a přípojkách Borová</i>		<i>0 dny</i>	<i>26.02. 21</i>	<i>26.02. 21</i>
37		Komunikace	30 dny	30 dny	21.09. 20	03.11. 20
38	PS1	Technologická část ČOV	251 dny	251 dny	02.03. 20	26.02. 21
39		<i>Zahájení prací na technologické části ČOV</i>		<i>0 dny</i>	<i>02.03. 20</i>	<i>02.03. 20</i>
40	PS1_10	Strojné-technologická část ČOV	45 dny	45 dny	02.03. 20	04.05. 20
41	PS1_20	Elektro-technologická část ČOV	45 dny	45 dny	23.03. 20	26.05. 20
42		<i>Předání díla</i>		<i>0 dny</i>	<i>26.02. 21</i>	<i>26.02. 21</i>

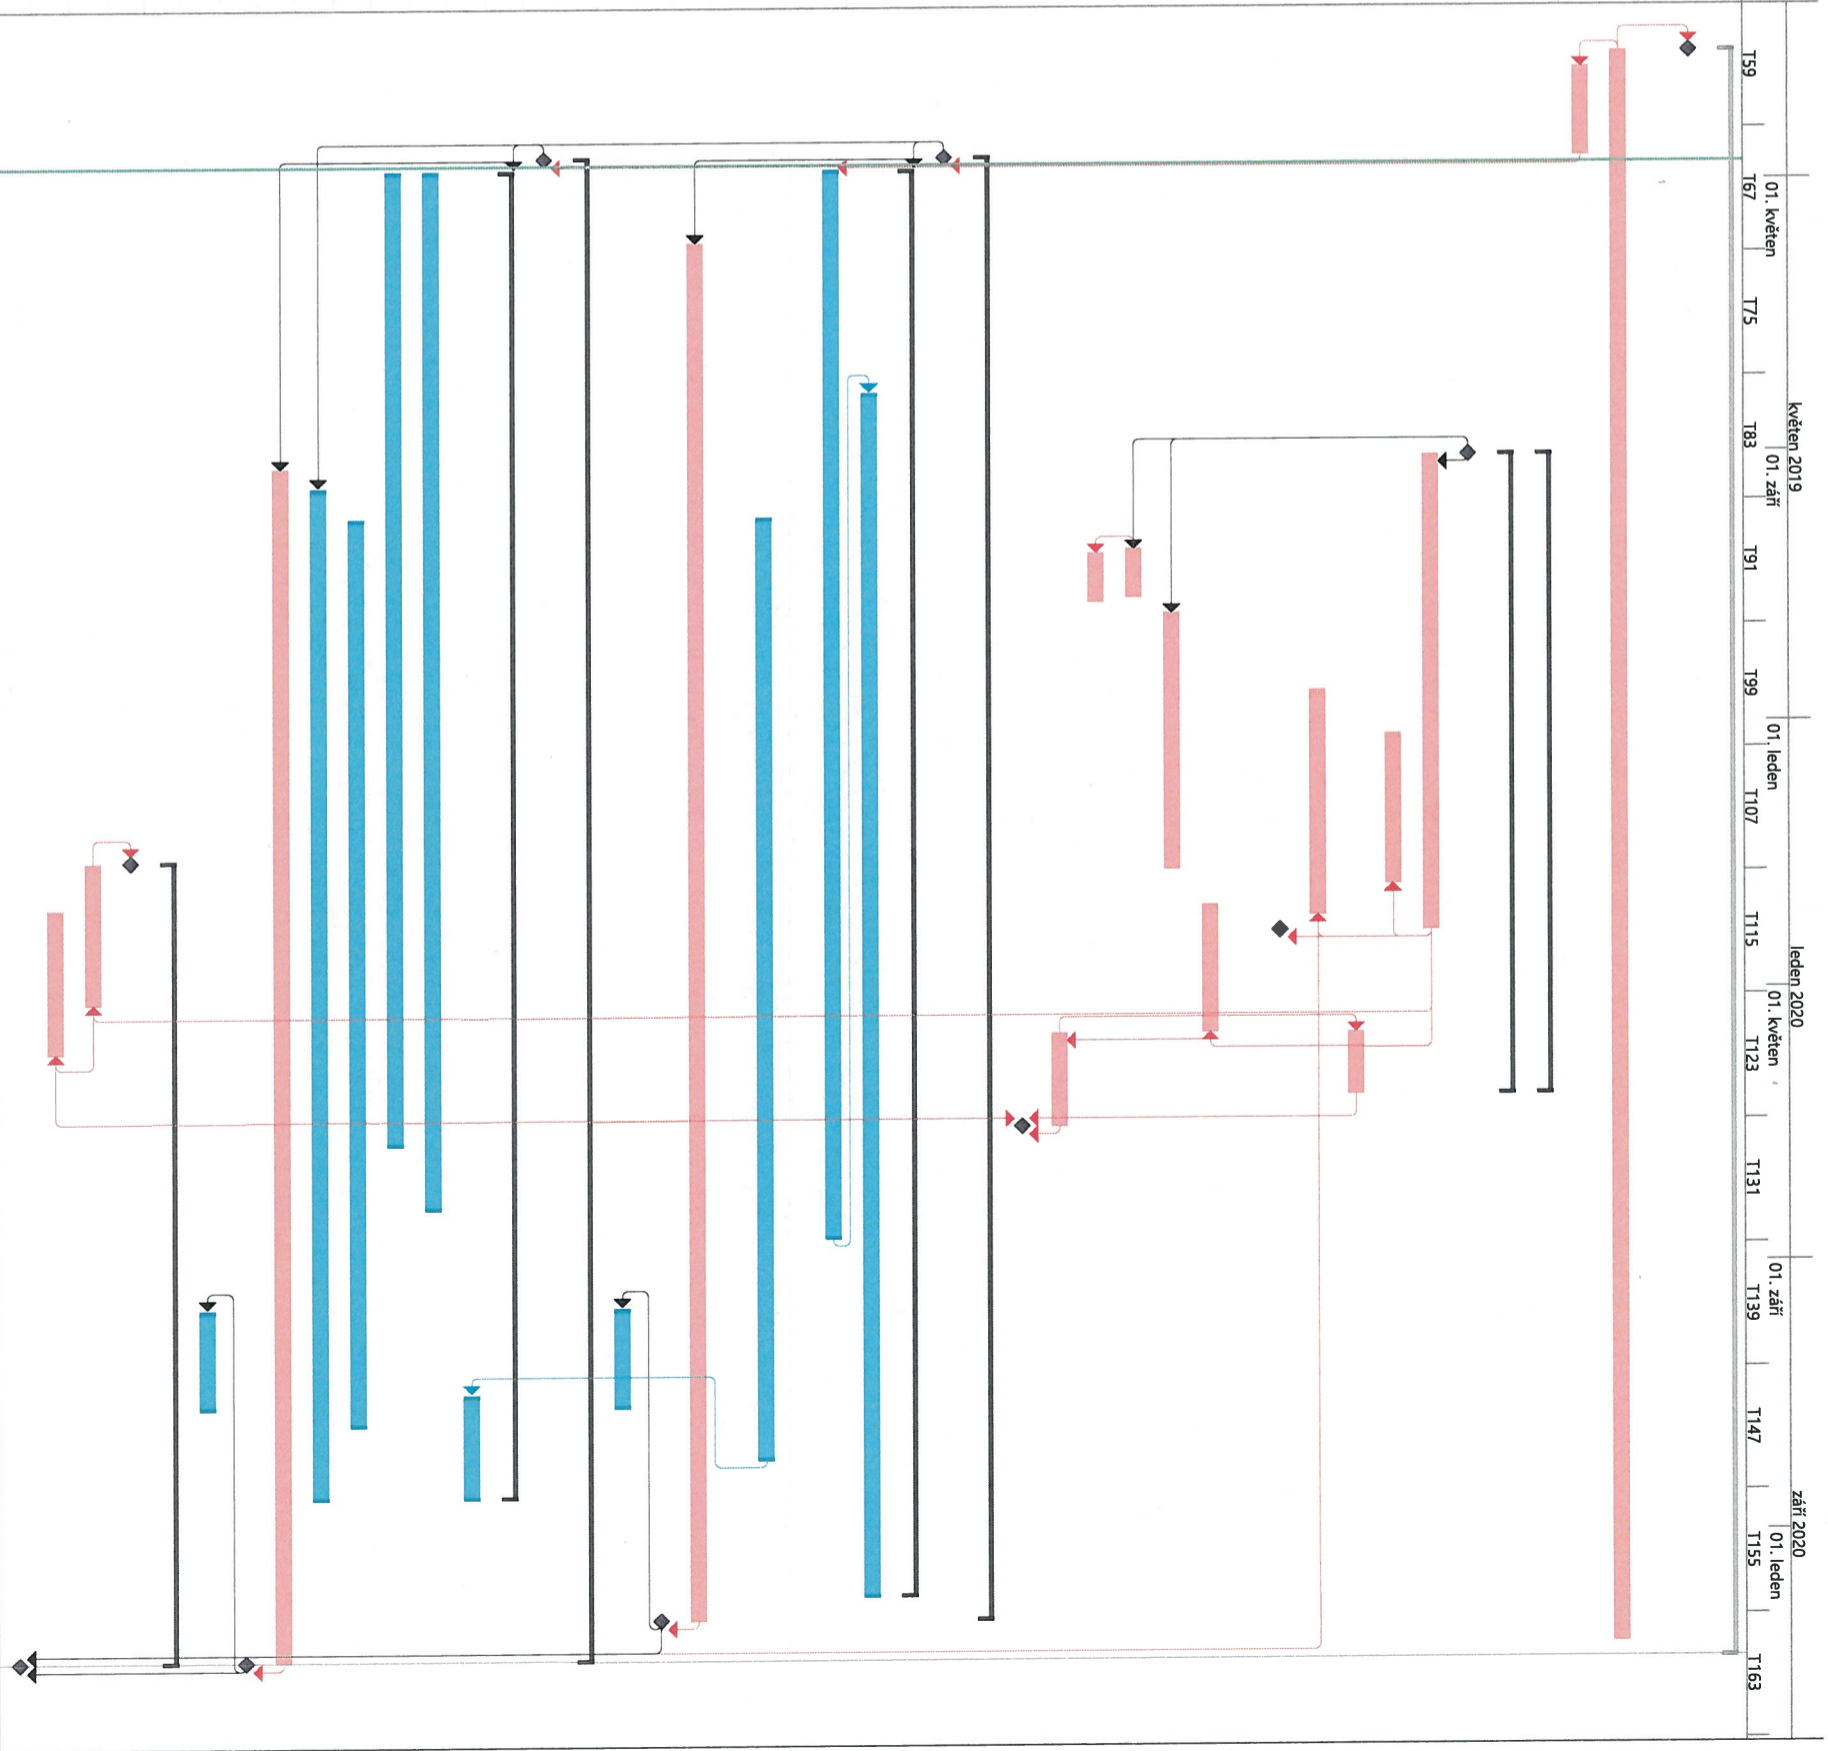

Úkol

Neaktivní úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Přiběh

Přiběh ručně zadaného úkolu

ii: TENTO HARMONOGRAM NENÍ ZÁVAZNÝ VE SMYSLU POSTUPOVÝCH/DÍLČÍCH TERMÍNŮ VÝSTAVBY. ZHOTOVITEL SI VYHRAŽUJE PŘÁVO JEJ AKTUALIZOVAT V PRŮBĚHU VÝSTAVBY !!
